PORTFOLIO · PROJECT MANAGEMENT SAP

PROPUESTA TÉCNICA · PREVENTA

Propuesta técnica de implementación SAP ERP, BW/BO y PI

INDUSTRIA	Distribución farmacéutica (operación por cuenta y orden de laboratorios)
TIPO DE PROYECTO	Implementación greenfield SAP ERP ECC 6.0 EhP6 + SAP BW/BO + SAP PI + Solution Manager
METODOLOGÍA	ASAP 8.0 – 5 fases
DURACIÓN ESTIMADA	13 meses (ERP + PI) con salidas escalonadas de BI/BO
FUENTE	Propuesta original de 112 páginas, condensada a sus capítulos de gestión

Documento de muestra. Se reemplazaron o eliminaron nombres de empresas y personas, hostnames, IPs, credenciales, números de ticket y cualquier dato que permita identificar al cliente o su infraestructura.

Qué muestra este documento

Cómo se estructura una propuesta de implementación desde la óptica de gestión: entendimiento del negocio, definición y evolución del alcance, premisas, gobierno del proyecto, cronograma macro, plan de recursos de ambas partes, matriz de comunicación, gestión de riesgos, control de cambios, estrategia de migración de datos y modelo de soporte post go-live.

1. Resumen ejecutivo

El cliente, una distribuidora del sector farmacéutico, busca una renovación tecnológica que soporte sus procesos de negocio con información integrada, homogénea y de rápida adaptación a cambios, con bajo costo de mantenimiento. La propuesta responde a una invitación a cotizar servicios de consultoría; el alcance fue definido en gran medida en conjunto con el cliente durante cuatro meses de relevamiento previo.

El enfoque requiere un esquema de trabajo conjunto: la consultora aporta recursos funcionales y técnicos calificados, y el cliente mantiene el compromiso de la dirección y asigna recursos internos dedicados.

Objetivos de negocio planteados por el cliente

- Operar el negocio de forma segura y estable en una primera etapa, incorporando luego mejoras basadas en las mejores prácticas SAP.
- Cubrir lo que hoy funciona en los sistemas legados, con las mejoras propias de SAP, e identificar incrementos futuros.
- Apegarse al estándar para reducir el costo total de propiedad sin sacrificar los diferenciadores del negocio.
- Mantener niveles de venta y prestaciones logísticas durante la puesta en marcha y los cierres de período.
- Registración correcta en origen, fuentes de información únicas y un mapa de aplicaciones alineado al mapa de procesos.
- Integración con la solución de gestión de almacenes del operador logístico tercerizado.

2. Alcance

Procesos clave del negocio

Ingreso de productos de laboratorios: interfaz de pedidos con laboratorios, notificación de recepciones al operador logístico, recepción y ubicación en almacén, confirmación de stock.

Venta: ingreso de pedidos de clientes por interfaz, circuito pedido–entrega–factura, notificación y confirmación de picking con el operador logístico, facturación.

Gestión por cuenta y orden de laboratorios: segregación de datos por laboratorio (esquema de seguridad), estado patrimonial y de resultados por laboratorio, cálculo impositivo y reporting legal por laboratorio, control de crédito por laboratorio con desbloqueo individual, pedidos con ítems de varios laboratorios.

Procesos específicos de la distribución: aplicación de “n” medios de pago a “m” facturas, proporcionalidad de pagos parciales entre comitentes, central de cheques, cálculo de comisión y facturación al cierre, ofertas y transfers, alto volumen de documentos concentrado en el cierre.

Componentes y frentes de servicio

Soluciones: SAP ERP ECC 6.0 EhP6, SAP BW (NetWeaver 7.3 EhP1), SAP BusinessObjects, SAP PI 7.1 y Solution Manager 7.0 EhP1. Frentes de servicio: Gobierno del proyecto, Consultoría ERP (FI-CO, TR, MM, SD), BI, BO, PI y Basis.

Evolución del alcance entre la primera y la segunda versión de la propuesta

Tras las sesiones conjuntas de relevamiento, el alcance se redefinió. El cuadro resume los cambios relevantes, una muestra de gestión del alcance antes de la firma del contrato:

Módulo / submódulo	1ª versión	2ª versión	Motivo del cambio
Activos Fijos (FI-AA)	No	Sí	Requerimiento identificado en relevamiento
Compras (MM-PUR) e Ingreso de facturas (MM-IV)	No	Sí	Compras no productivas y servicios logísticos
Gestión de Almacenes (WM)	Sí	No	Se reemplaza por interfaces con el WMS/TMS del operador logístico
Business Content WM (BW)	Sí	No	Consecuencia de excluir WM
Data warehouse legado	Integrar	Reemplazar	Se migran a SAP BI/BO los modelos analíticos existentes
FI (GL, New GL, AP, AR, BL), TR-CM, CO, SD, MM-IM	Sí	Sí	Sin cambios

Modelos analíticos custom incluidos en BI/BO: Stock, Ventas, Cobranzas, Cash Flow, Cash Flow proyectado, Notas de crédito a obras sociales, Presupuesto de ventas, Stock en droguerías y Presupuesto de tesorería.

Premisas de alcance

- Implementación sobre mejores prácticas SAP y localización estándar para Argentina (impuestos y normativa legal).
- Definición de negocio: una factura por laboratorio, para evitar adaptaciones con impacto en el plazo.
- Fuera de alcance: SAP Transportes (LE-TRA) y SAP WMS; se cubren con interfaces de ida y vuelta con el operador logístico.
- Rentabilidad (CO-PA) no incluida; si se confirma su necesidad en la fase de Planos del Negocio se cotiza por separado.
- Desarrollos ABAP estimados en 1.150 días-hombre; los GAPs nuevos detectados en el BBP se estiman y cotizan por tiempo y materiales.
- Unas 40 interfaces agrupadas, con apertura y mapeo resueltos en SAP PI; integración con estándar GS1.
- Fuera de alcance: migración de datos históricos del data warehouse actual.

3. Estrategia de implementación


El enfoque descansa en dos pilares:

- **Proyecto completo:** poner en marcha los circuitos de negocio definidos en el alcance, dejando para una segunda etapa las funcionalidades que se incorporarán como mejora continua.
- **Equipo integrado:** un único equipo de proyecto con objetivos comunes entre cliente y consultora, organizado por frentes.


Cronograma macro

Inicio estimado en el Mes 1. Para el ERP se previeron dos semanas de vacaciones dentro del Mes 8, por lo que el go-live se ubica en el Mes 9.

SAP ERP + SAP PI

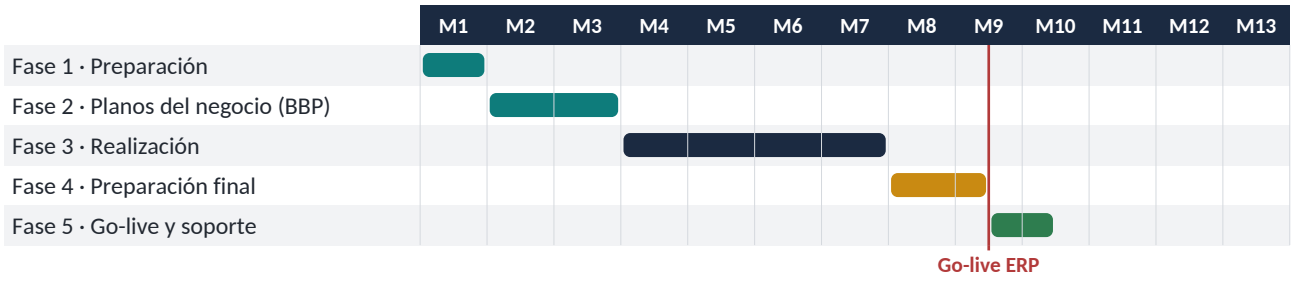

SAP BI / BO

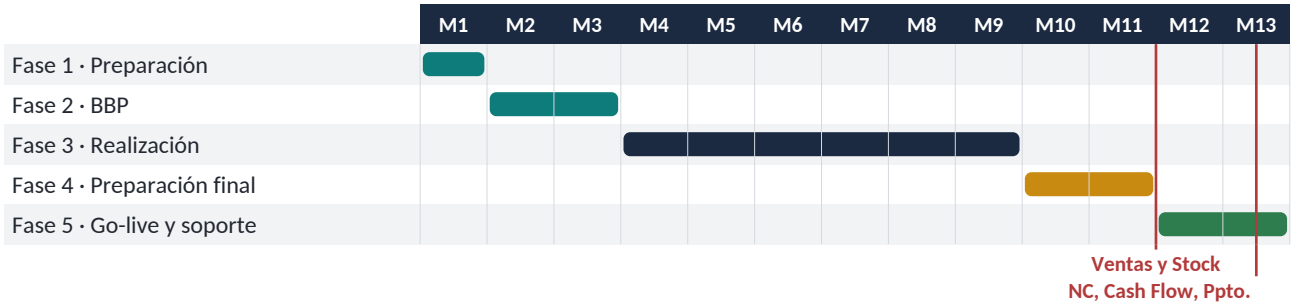

Las barras representan la secuencia de fases; los hitos marcan las dos salidas escalonadas de los modelos analíticos.

4. Gobierno del proyecto: roles y responsabilidades

Rol	Integrantes	Responsabilidades principales
Comité de Dirección	Sponsor, responsable de IT y gerente de proyecto del cliente; representante de la dirección y gerente de proyecto de la consultora. 4–6 h/mes.	Aprobar entregables de cada fase; autorizar cambios que alteren presupuesto o plazo; seguimiento quincenal del avance; asegurar un plan de gestión del cambio y comunicación.
Sponsor	Ejecutivo del cliente	Informar al comité ejecutivo; priorizar temas críticos con decisiones estratégicas; proveer recursos; resolver controversias; articular con el frente de gestión del cambio.
Gerencia de Proyecto	Un PM por cada parte	Elaborar y mantener el plan; controlar avance, presupuesto y desvíos; reportar al comité; gestionar el registro de pendientes (aceptar, rechazar o postergar por importancia y urgencia).
Líderes de frente	Finanzas, Logística, BI/BO, Desarrollo (integración, migración, ABAP), Basis	Reportar quincenalmente avance real vs. previsto por actividad, desvíos y causas; mantener el registro de temas pendientes del frente.
PMO (recomendada)	Soporte a la Gerencia	Toma de avance, estándares y templates, revisión de issues, agendas, control de estándares de documentación y uso de Solution Manager.

Plan de recursos del cliente (dedicación por fase)

Rol	F1	F2	F3	F4	F5
Gerente de proyecto	100%	100%	100%	100%	100%
Analistas funcionales: Finanzas, Depósito, Ventas, Integración y conversiones	50%	100%	100%	100%	100%
Analista de infraestructura (IT, redes)	50%	30%	30%	30%	30%
Analista data warehouse (BI/BO)	20%	100%	100%	100%	100%
Programadores interfaces y ABAP (a capacitar)	–	–	50%	50%	–
Usuarios clave por área (Finanzas, Depósito, Compras, Ventas)	10%	40%	40%	40%	–

La consultora asigna un gerente de proyecto y líderes por frente: Finanzas (FI-CO), Logística (SD, MM e integración con el operador logístico), BI/BO, Desarrollo (integración, migración, ABAP) y Basis.

5. Gestión y control

Planificación, ejecución y control

- Cronograma desagregado por etapa, fase, actividad y tarea; ninguna actividad controlable supera 10 días hábiles (óptimo: 40 horas-hombre).
- Al inicio de cada fase se revisa y re-planifica; la Gerencia de Proyecto valida la versión definitiva.
- Reporte quincenal por actividad: avance real, avance previsto, desvío y evaluación del impacto de sus causas.
- Cada actualización del cronograma se versiona con fecha; los cambios con impacto pasan por el procedimiento de control de cambios.
- Herramientas: Solution Manager como repositorio y gestión metodológica, complementado con MS Project y MS Visio.

Matriz de comunicación

Evento	Audiencia	Contenido	Frecuencia	Duración
Comité de Dirección	Comité y gerentes de proyecto	Avance, issues, riesgos, decisiones, entregables	Mensual	2 h
Avance de equipos funcionales	Consultores y equipo del cliente	Estado vs. cronograma por módulo	Semanal	1 h
Avance de equipos técnicos	Equipo técnico de ambas partes	Estado de desarrollos	Semanal	1 h
Seguimiento de issues y pendientes	Gerencia, consultores y usuarios clave	Plan de acción y depuración	Semanal	1 h
Revisión de riesgos	Gerencia y QA	Riesgos y acciones	Quincenal	1 h
Lanzamiento de fase	Equipo de proyecto	Objetivos, roles, cronograma, entregables	Inicio de fase	3 h
Integración / revisión de solución / estado técnico	Según tema	Agenda específica	A demanda	1–2 h

Matriz de riesgos (extracto)

Escala de 1 a 5 para probabilidad y severidad; nivel = probabilidad × severidad.

Área	Riesgo	Impacto	P	S	Nivel	Mitigación
Solución	Altas expectativas de los usuarios clave	Costos	3	4	12	Transmitir mejores prácticas SAP y simplificar procesos
Gestión del cambio	Procesos que exigen mayor conocimiento funcional/técnico	Calidad	3	4	12	Identificar casos y abordarlos con RRHH / gestión del cambio
Solución	Depuración de datos compleja por diversidad y volumen de fuentes	Calidad	4	4	16	Plan temprano de datos; involucrar áreas técnicas y funcionales
Solución	Requerimientos basados en el sistema y procesos actuales	Costos	4	3	12	Reforzar el ajuste al estándar; escalar resistencias
Gerenciamiento	Falta de comunicación e integración entre frentes	Plazo	–	–	–	Reuniones de integración y comunicación sistemática

Otros componentes del modelo de gestión: matriz de entregables, aseguramiento de calidad, procedimiento de cambio de alcance, factores críticos de éxito y mejores prácticas de programación y conversión de datos.

6. Estrategias transversales

Migración de datos

Modelo ETL (extraer, transformar, cargar) con un repositorio central de ensayo y transformación. Fuentes: extracciones de los sistemas legados sin filtros, recolección manual asistida y planillas. Herramientas de carga: LSMW, CATT, programas ABAP o carga manual. Las actividades se alinean con las fases ASAP:

Fase	Actividades de datos
Preparación	Equipos, capacitación en la metodología, identificación de legados y calidad del dato, alcance y plan de migración.
Planos del negocio	Evaluación de calidad, diseño de cargas automáticas y manuales, seguridad del dato, estrategia de pruebas.
Realización	Depuración, extracción, recolección de datos nuevos, desarrollo y prueba de programas, validación en SAP.
Preparación final	Preparación final, estrategia de saldos iniciales y partidas abiertas, cargas en productivo, integridad.
Puesta en marcha	Firma de aceptación del usuario y correcciones puntuales.

Roles por entidad de datos: propietario de negocio (firma estrategia, plan de corte y salida en vivo), analista de negocio, consultor funcional (mapeo de campos), propietario del sistema legado (extracciones a tiempo) y analista de datos (rutinas de carga). Artefactos: inventario de archivos con calidad del dato, inventario de tablas de correspondencia, y documentos de diseño de limpieza, preparación y carga con nomenclatura estándar.

Capacitación y transferencia de conocimiento

Entrenamiento inicial al equipo de proyecto, formación de líderes para conducir el cambio, capacitación en nuevos procesos y en SAP, y desarrollo del equipo interno de gestión del cambio. La capacitación final a usuarios clave es responsabilidad del cliente con asistencia de los consultores (esquema “entrenar al entrenador”).

Seguridad

En la fase de Planos del Negocio se construye la lista maestra de transacciones, base de la matriz de roles y perfiles por puesto. El cliente aprueba la matriz considerando sus controles de auditoría; la consultora configura los roles y los usuarios clave los validan en las pruebas integrales.

Soporte post implementación

Un mes de acompañamiento posterior al go-live, con foco en los primeros incidentes, cierre de pendientes y transferencia de conocimiento a la mesa de ayuda. Modelo de cuatro niveles con ticket obligatorio:

Nivel	Responsable	Alcance
1	Mesa de ayuda del cliente	Asistencia al usuario, bloqueos, contraseñas; deriva errores con ticket.
2	Consultores SAP funcionales y técnicos	Diagnóstico y resolución.
3	Equipo único de cambios	Modificaciones complejas, centralizando el control de cambios.
4	Fabricante (SAP)	Errores de producto.

7. Metodología ASAP

Fase	Propósito	Entregables / hitos
1. Preparación	Planificación inicial, estándares, requerimientos técnicos y hardware, formación nivel 1.	Plan detallado, kickoff con la organización.
2. Planos del negocio	Requerimientos de procesos en dos etapas: alto nivel y detalle por proceso.	Matriz de procesos y BBP detallado firmados; sistema de desarrollo instalado.
3. Realización	Configuración base (~80%), configuración final por ciclos (~20%) y pruebas integrales.	Conversiones, interfaces y mejoras desarrolladas; pruebas integrales aprobadas.
4. Preparación final	Pruebas finales, volumen y estrés, aceptación, capacitación de usuarios, plan de corte.	Aprobación de salida a productivo y mesa de ayuda constituida.
5. Go-live y soporte	Ajuste fino, atención de consultas, sesiones EarlyWatch y medición de beneficios.	Cierre del proyecto.

Supuestos generales (extracto)

- Gestión, administración y coordinación conjunta entre cliente y consultora en todas las instancias.
- El cliente revisa y aprueba entregables en los plazos acordados en la fase de preparación.
- Adaptación de procesos al estándar SAP, descartando modificaciones y minimizando desarrollos.
- Toda actividad fuera de alcance se cotiza y se gestiona mediante el procedimiento de cambio de alcance.
- Atrasos atribuibles a ampliaciones de alcance o incumplimientos de compromisos se re-planifican de común acuerdo.
- Fuerza mayor: notificación inmediata y suspensión de fechas por el período de afectación.
